

MetricFlow SQA: Cierre de Iteración E1 y Plan de Iteración E2

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Seguimiento de riesgos

03

Plan de Pruebas

02

Cierre de Iteración E1

04

Plan de Iteración E2

05

Gráficos



¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



Seguimiento de Riesgos

RK02 - Dadas las estimaciones optimistas en tiempos de desarrollo podría ocurrir un desfase en las entregas, lo que conduciría a acumulación de tareas y presión sobre el equipo

Plan de Mitigación

	Tarea
	Establecer márgenes de tiempo en tareas críticas en el plan de iteración
	Controlar continuamente los avances mediante Trello

Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Implementar herramientas de gestión

RK04 - Dada la falta de conocimiento del equipo sobre estándares de calidad en el desarrollo de software, podría ocurrir una aplicación inadecuada de buenas prácticas, lo que conduciría a un aumento en la complejidad del proyecto

Plan de Mitigación

	Tarea
	Investigar acerca de los estándares de calidad

Seguimiento de Riesgos

RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Comunicación anticipada con el cliente

Plan de Contingencia

	Tarea
	Gestionar los cambios de manera formalizada
	Planificar el próximo Plan de Iteración

Cierre de Iteración E1

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Inicio real	Fin real	Responsable
Elaborar un informe de Métricas para los demás grupos	-	-	15/09/25	15/09/25	Fabricio Nuñez
Elaborar presentación	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	Santiago Pacheco
Especificación de Requerimientos	15/09/2025	17/09/2025	16/09/25	16/09/25	Fabricio Nuñez
Diagrama de casos de uso	16/09/2025	17/09/2025	-	16/09/25	Lorenzo Teppa
Elaboración de prototipos	-	-	16/09/25	16/09/25	Santiago Pacheco
Entrevista con clientes	16/09/2025	16/09/2025	No ocurrió	No ocurrió	Todos
Comunicación con el cliente	-	-	16/09/25	19/09/25	Todos

Cierre de Iteración E1



Objetivos alcanzados



Plan de Proyecto



Plan Gestión de Riesgos



Plan de Estimación



Plan de Calidad

Cierre de Iteración E1



Objetivos alcanzados




Herramientas y Tecnologías



Especificación de Requerimientos

Cierre de Iteración E1



Objetivos NO alcanzados



Entrevistas con los clientes

Plan de Pruebas



Casos de Prueba por Prioridad de CU



Esenciales



Esperados




Deseados

Plan de Pruebas



Plan de Iteración E2 - Fase de Elaboración



Elementos de la Línea Base



Modelo de Casos de Uso




Plan de estimación



Primer Prototipo Funcional

Plan de Iteración E2 - Fase de Elaboración



Elementos de la Línea Base



Modelo de Datos



Plan de Pruebas



Modelo de Diseño Inicial


Plan de Iteración E2 - Planificación

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Responsable ¹
Planificar métricas de calidad	24/09/2025	24/09/2025	EM
Modelo de Casos de Uso	24/09/2025	25/09/2025	FN, LT
Investigar sobre diagramas de componentes y de paquetes.	24/09/2025	24/09/2025	LT
Revisar Modelo de Casos de Uso	25/09/2025	25/09/2025	EM
Elaborar presentación	25/09/2025	25/09/2025	SP
Realizar estimación fase de elaboración iteración 2	27/09/2025	28/09/2025	SP
Revisar Estimación fase de elaboración iteración 2	29/09/2025	29/09/2025	EM
Primer prototipo funcional	25/09/2025	27/09/2025	MS, LT
REUNIÓN	27/09/2025	27/09/2025	Todos los integrantes


Matriz de Trazabilidad

[illegible]

Diagrama de Casos de Uso

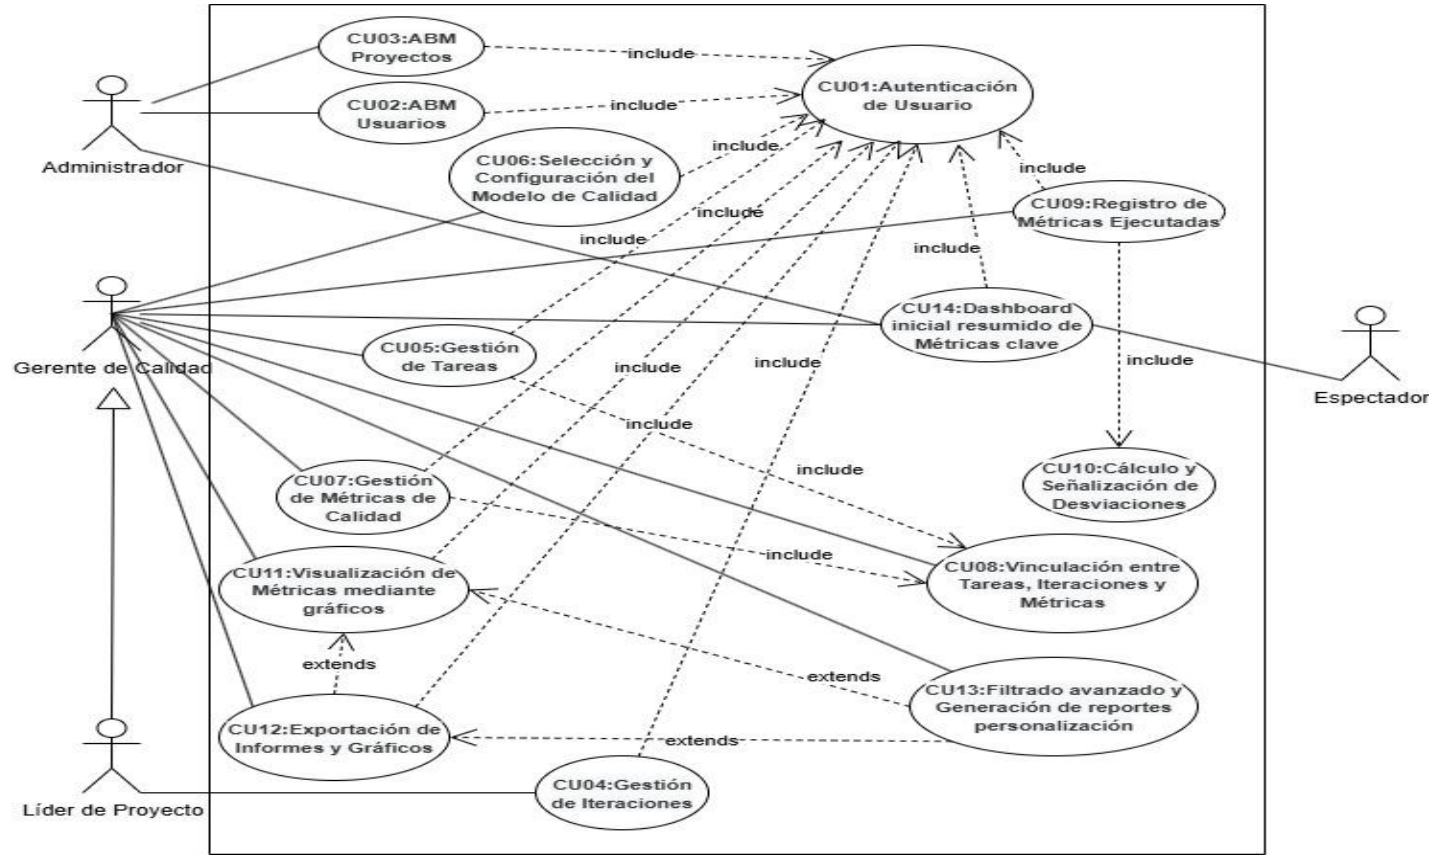


Convergencia de Estimaciones

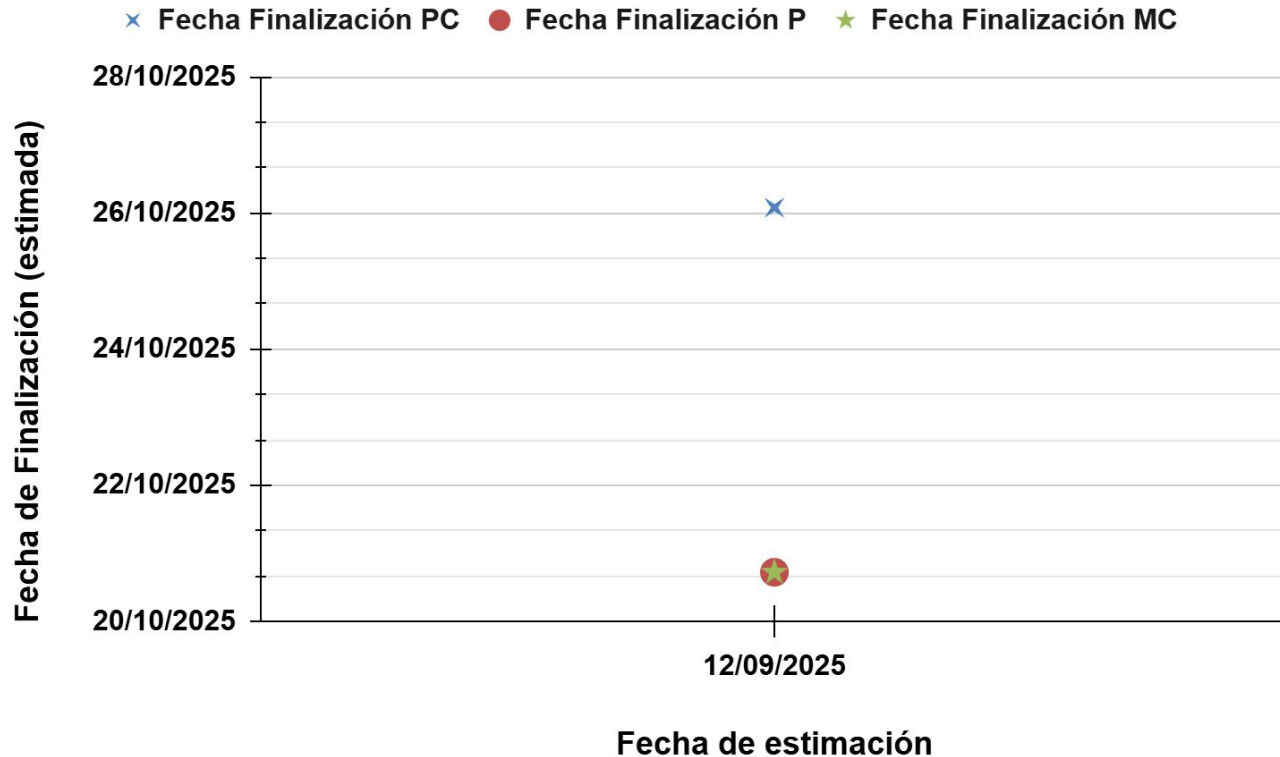


Esfuerzo Semanal

Esfuerzo Semanal - Fase Elaboración I

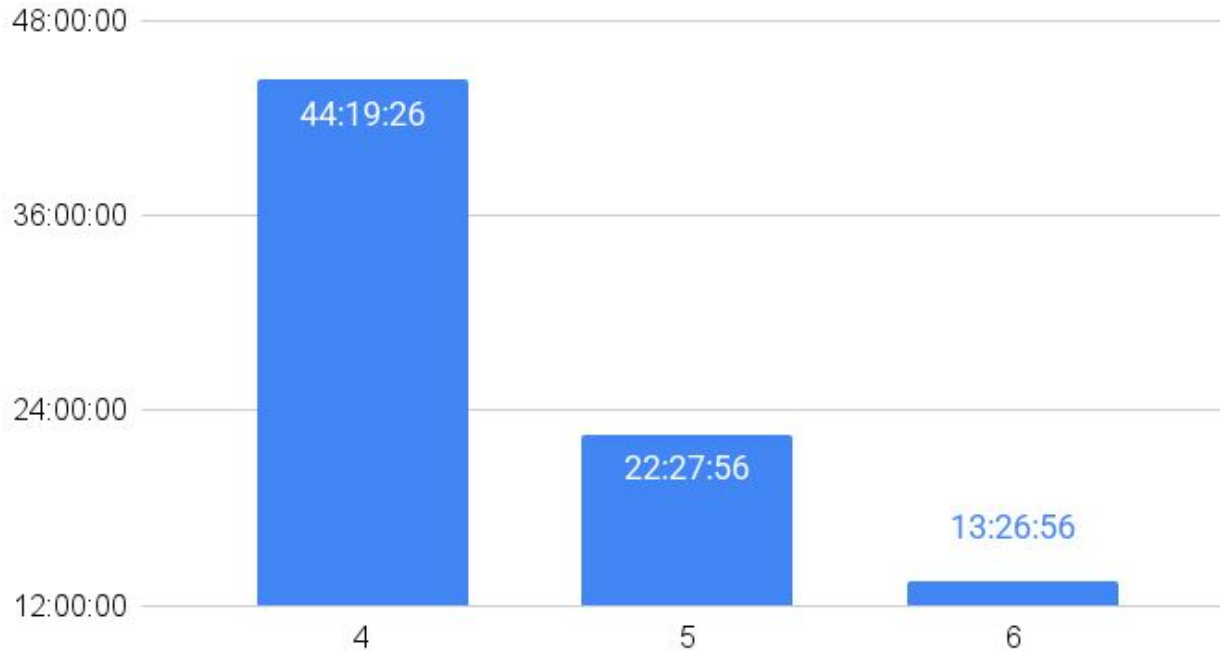


Esfuerzo por Actividad

Esfuerzo por Actividad

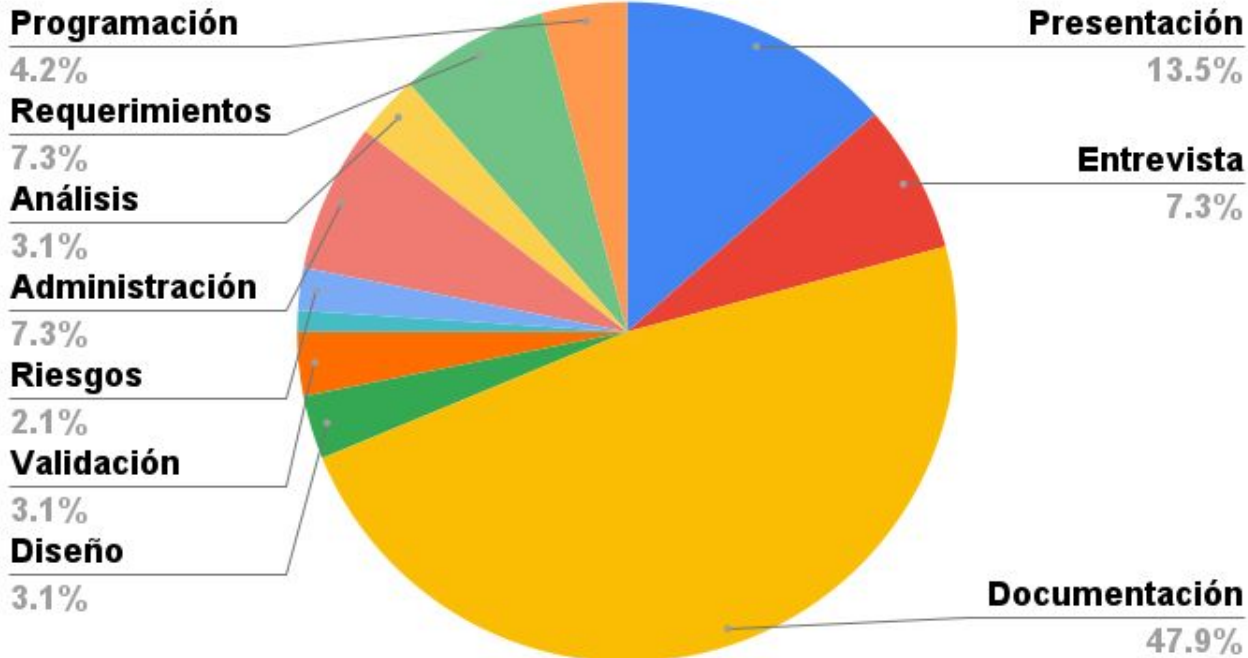

Commits

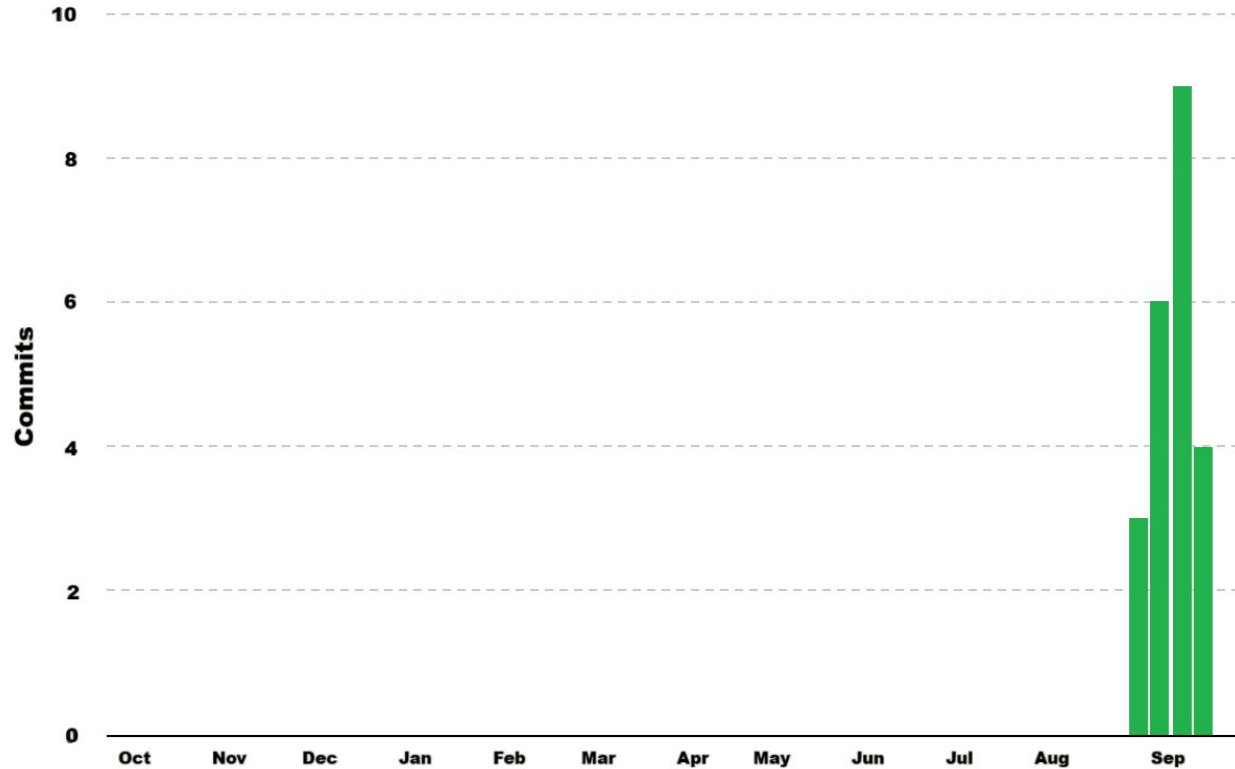

Métricas de Calidad

Métricas de Proceso



Métricas de Calidad

Métricas Porcentuales



¡Muchas gracias!

