

MetricFlow SQA: Priorización e Inicio Diseño 1º Tanda de CU

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Seguimiento de riesgos

02

CU a implementar

03


Gráficos

¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



Diagrama de Casos de Uso

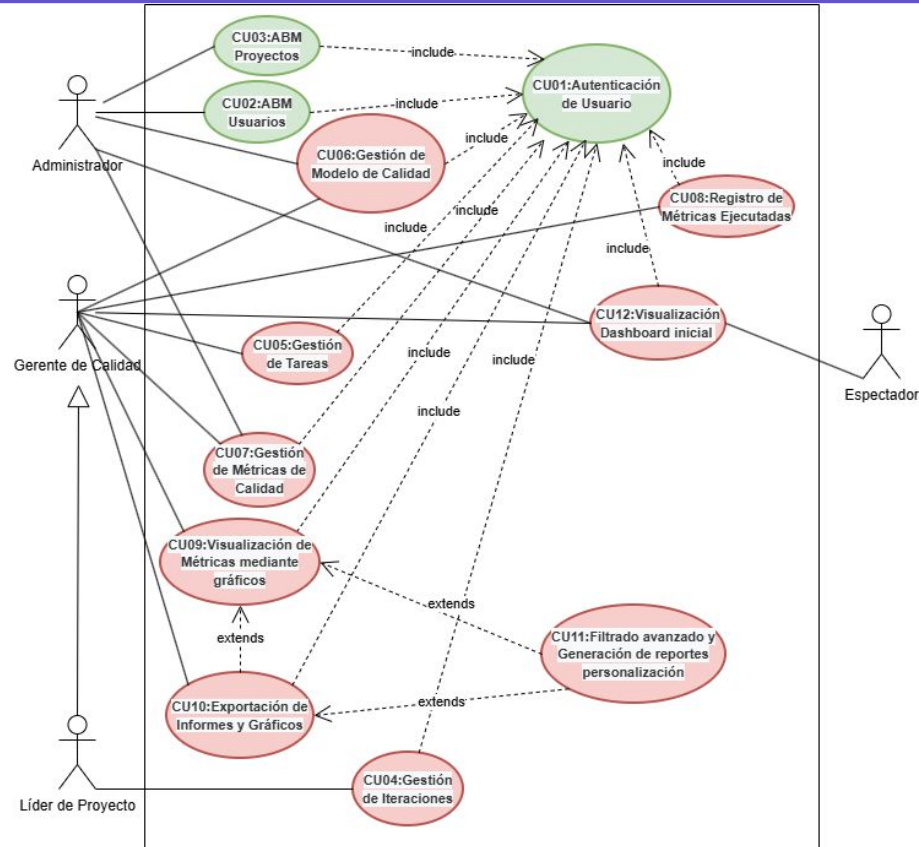

Resumen de Casos de Uso del Proyecto

Caso de Uso	Estado
<u>CU01</u> : Autenticación de Usuarios	Implementado
<u>CU02</u> : Gestión de Usuarios	Implementado
<u>CU03</u> : Gestión de Proyectos	Implementado
<u>CU04</u> : Gestión de Iteraciones	Pendiente
<u>CU05</u> : Gestión de Tareas	Pendiente
<u>CU06</u> : Gestión de Modelo de Calidad	Pendiente

Caso de Uso	Estado
<u>CU07</u> : Gestión de Métricas de Calidad	Pendiente
<u>CU08</u> : Registro de Métricas Ejecutadas	Pendiente
<u>CU09</u> : Visualización de Métricas mediante gráficos	Pendiente
<u>CU10</u> : Exportación de Informes y Gráficos	Pendiente
<u>CU11</u> : Filtrado avanzado y Generación de reportes	Pendiente
<u>CU12</u> : Visualización Dashboard inicial	Pendiente

Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Realizar retrospectiva para evaluar eficiencia de las herramientas de gestión (Trello, Toggl, GitHub, etc)

Seguimiento de Riesgos


RK16 - Dada la complejidad del sistema y la falta de mecanismos de prueba, podría ocurrir una dificultad para detectar errores en el software, lo que conduciría a fallas no identificadas durante la fase de desarrollo y posibles defectos en el producto final.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Investigar métodos de prueba adecuados
	Modificar los casos de prueba para mejorar la detección de errores



Prioridad de implementación de CU



De valor esencial




De valor agregado



De valor complementario

Prioridad de implementación de CU



CU06: Gestión de Modelo de Calidad

CU07: Gestión de Métricas de Calidad

CU08: Registro de Métricas Ejecutadas

CU12: Visualización Dashboard inicial

Prioridad de implementación de CU



CU09: Visualización de Métricas mediante gráficos

CU10: Exportación de Informes y Gráficos

CU11: Filtrado avanzado y Generación de reportes

Prioridad de implementación de CU



CU01: Autenticación de Usuarios

CU02: Gestión de Usuarios

CU03: Gestión de Proyectos

CU04: Gestión de Iteraciones

CU05: Gestión de Tareas

Diagrama de Dependencias

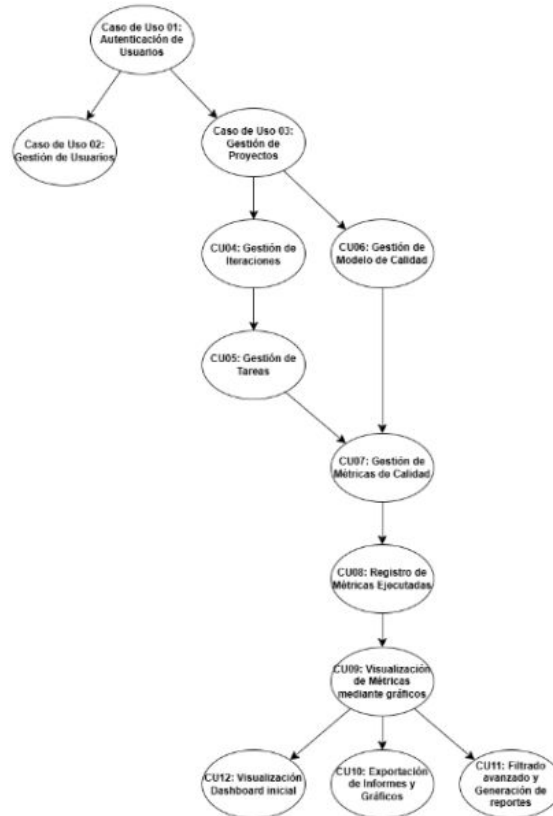


Diagrama de Dependencias



Diagrama de Dependencias


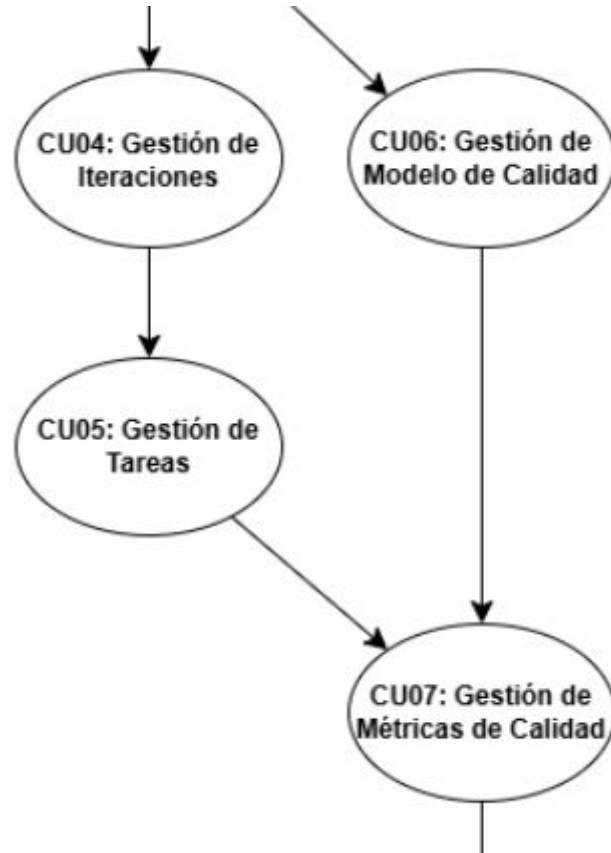


Diagrama de Dependencias

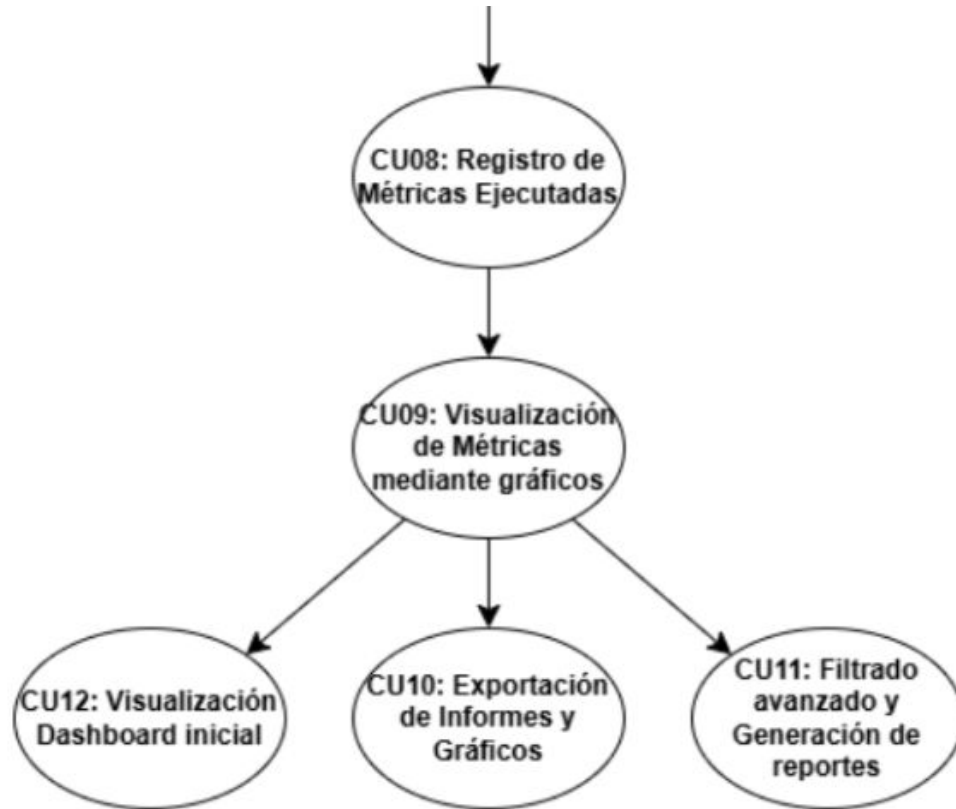

Planificación

Fase	Casos de Uso	Fecha de inicio	Fecha de entrega
E2	CU01: Autenticación de Usuarios.	07/10	10/10
	CU02: Gestión de Usuarios.		
	CU03: Gestión de Proyectos.		
C1	CU06: Gestión de Modelo de Calidad.	21/10	28/10
	CU07: Gestión de Métricas de Calidad.	21/10	28/10
	CU08: Registro de Métricas Ejecutadas.	21/10	28/10
	CU12: Visualización Dashboard inicial.	21/10	28/10


Planificación

C2	CU09: Visualización de Métricas mediante gráficos.	29/10	07/11
	CU10: Exportación de Informes y Gráficos.	29/10	07/11
	CU11: Filtrado avanzado y Generación de reportes.	29/10	07/11
C3	CU04: Gestión de Iteraciones.	08/11	14/11
	CU05: Gestión de Tareas.	08/11	14/11

Estimación N°5


	Mejor Caso	Caso Probable	Peor Caso
Resultado (meses)	3,9	4,2	5,3
Esfuerzo h-h	1170	1260	1590

Convergencia de Estimaciones

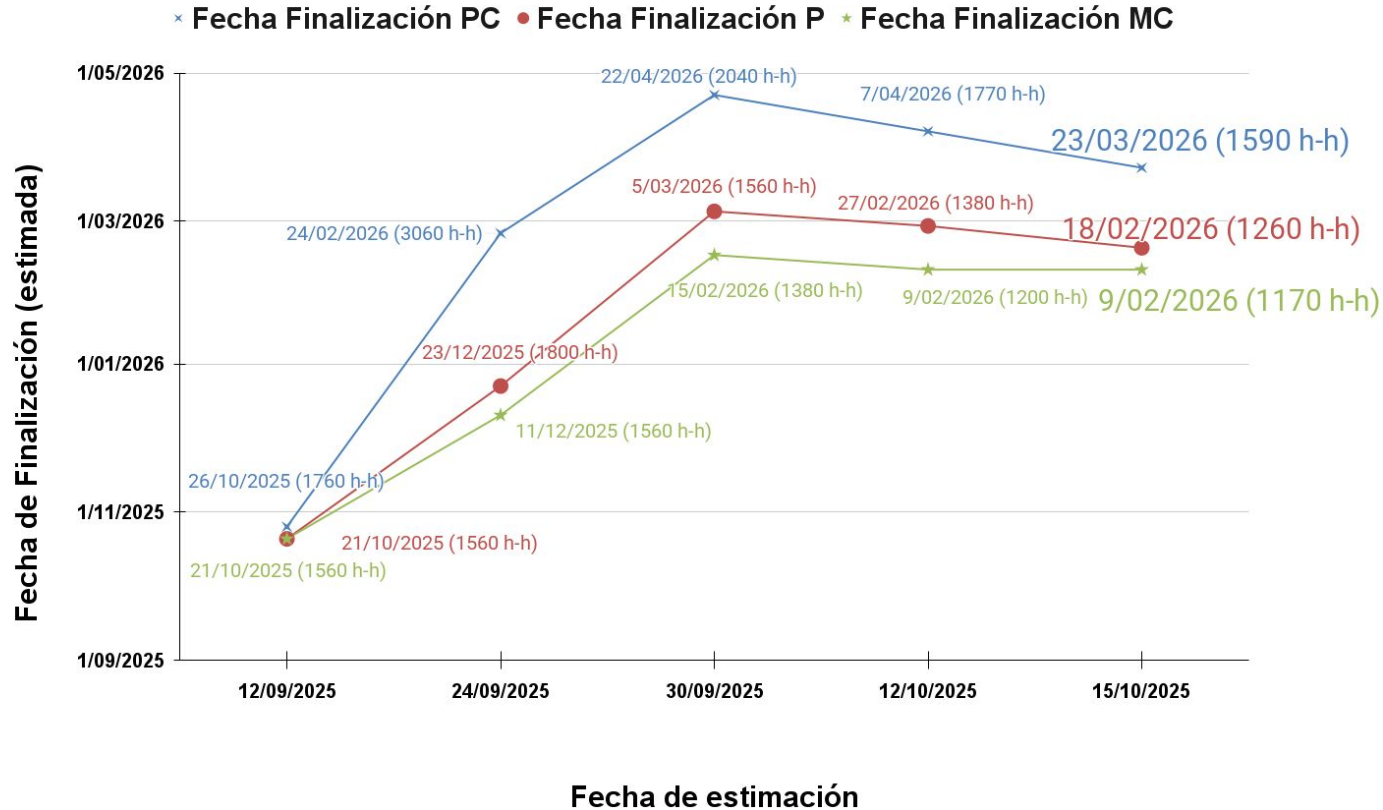


Esfuerzo Semanal

Esfuerzo Semanal - Fase Construcción I

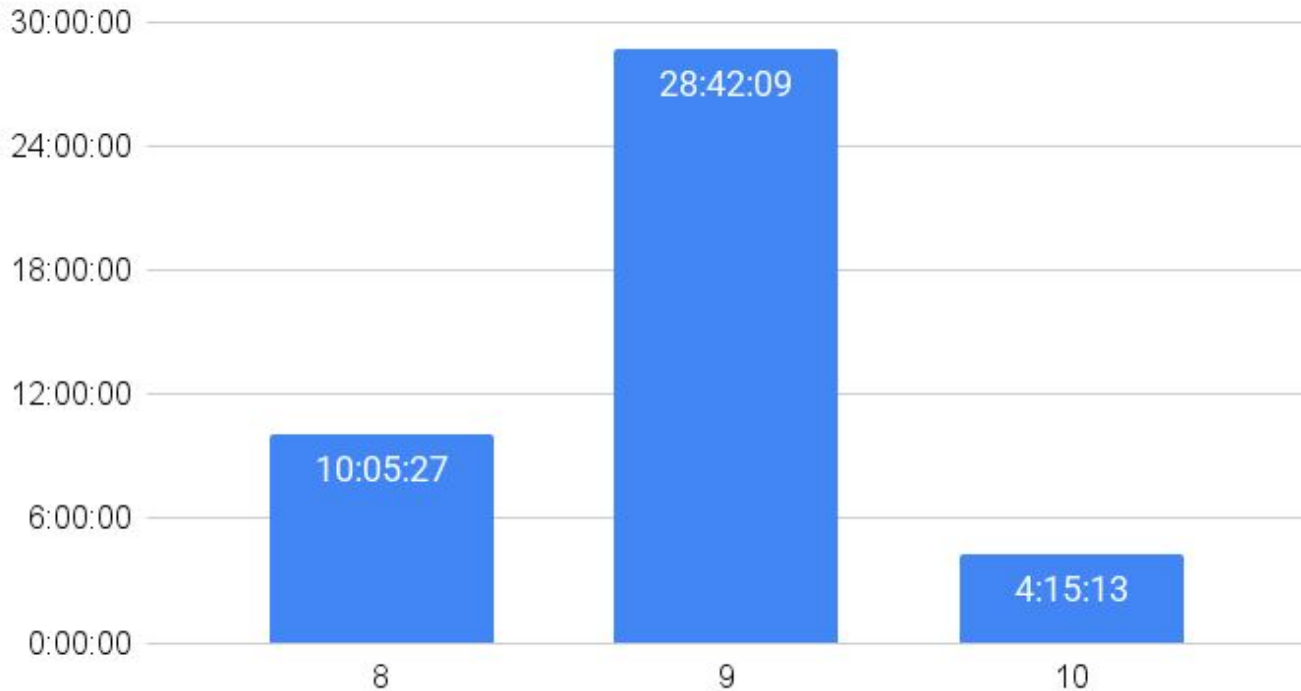


Esfuerzo por Actividad (Total:317:24:39)

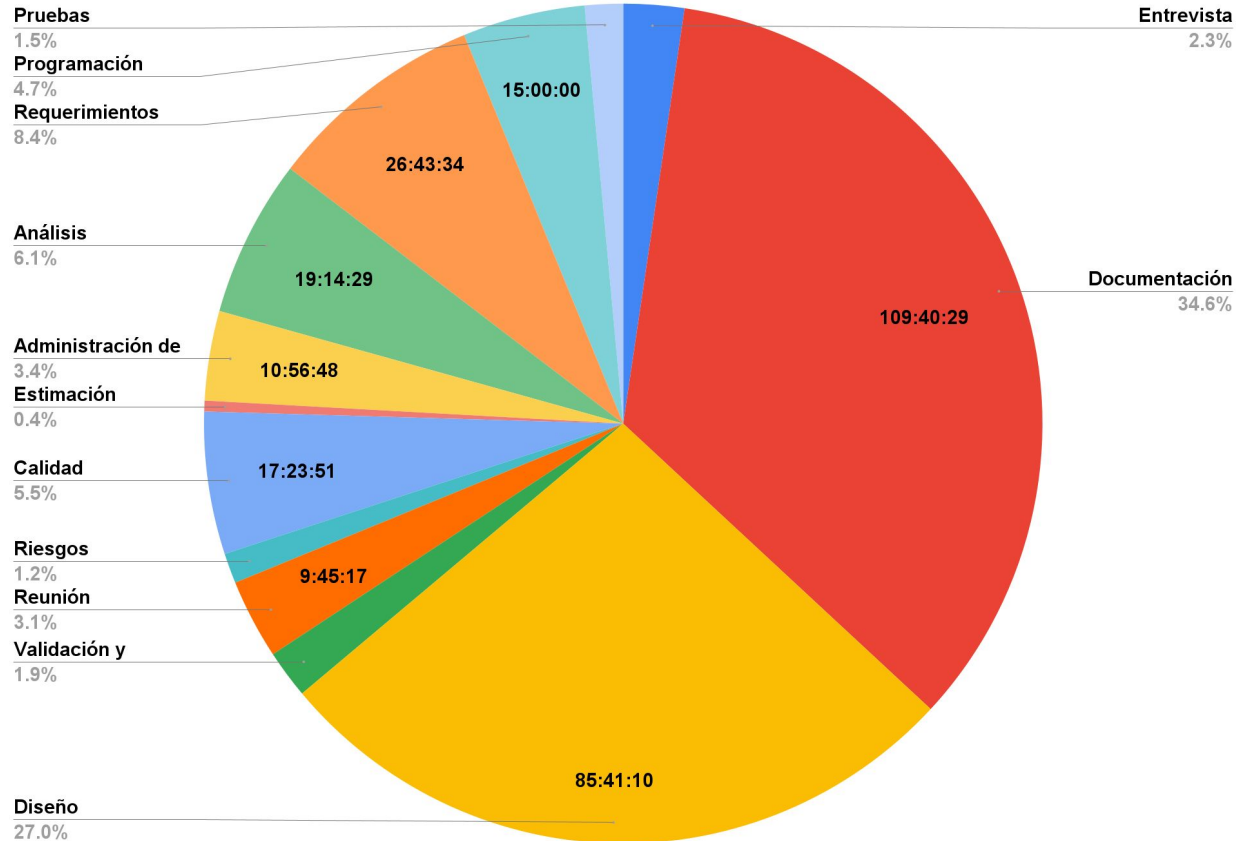


Esfuerzo por CU (Total:2:58:35)

● CU1:Autenticación de Usuarios ● CU2: Gestión de Usuarios ● CU3: Gestión de Proyectos

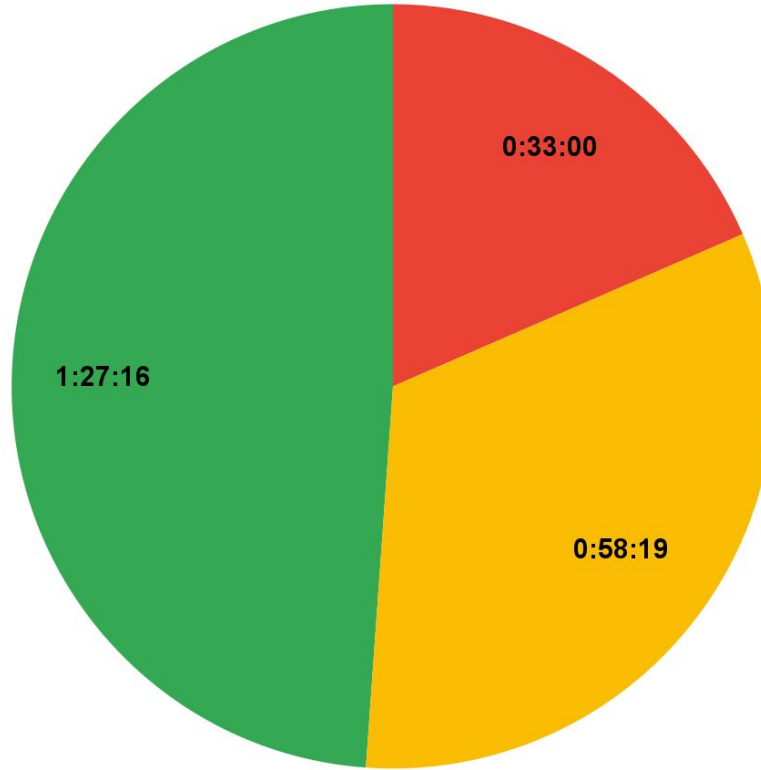


Commits (54)

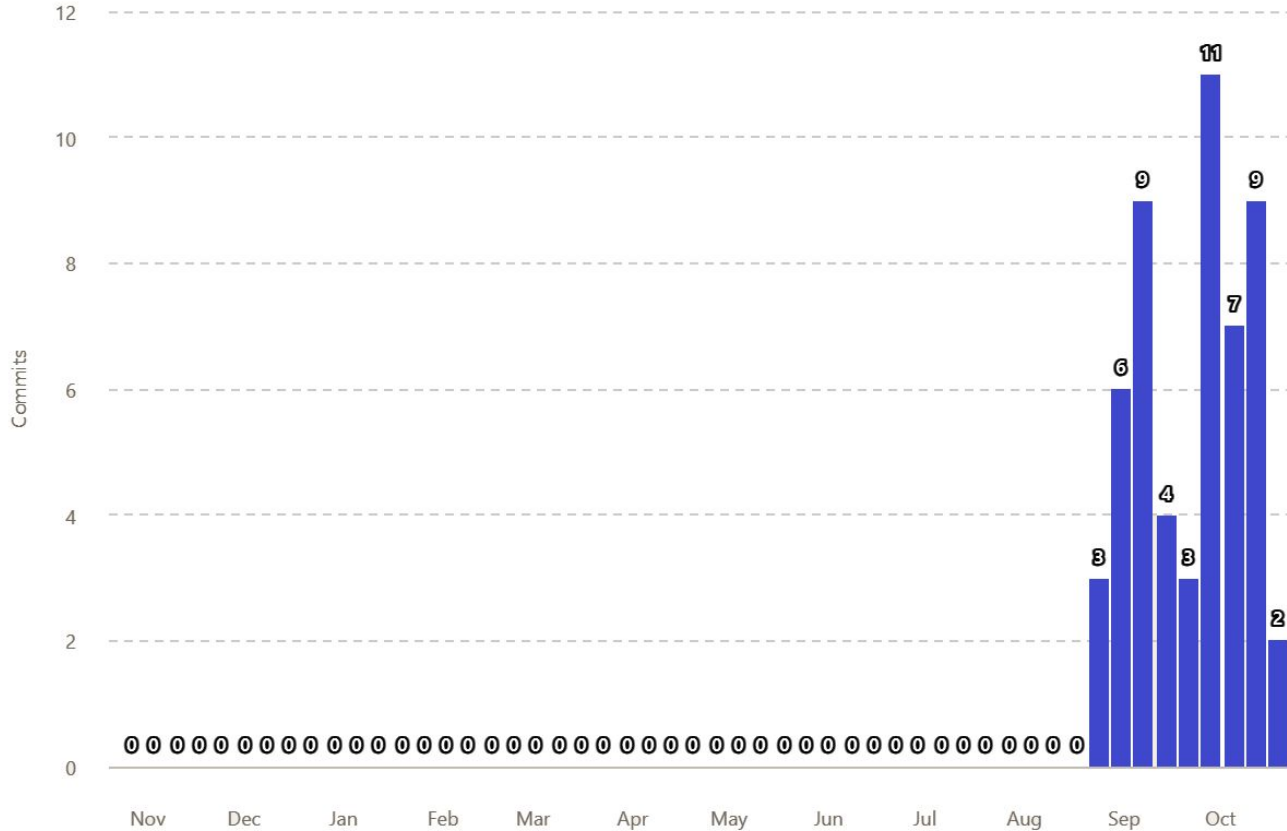


Métricas de Calidad C1

— PROGRESO ■ FALTANTE ■ CUMPLIMIENTO

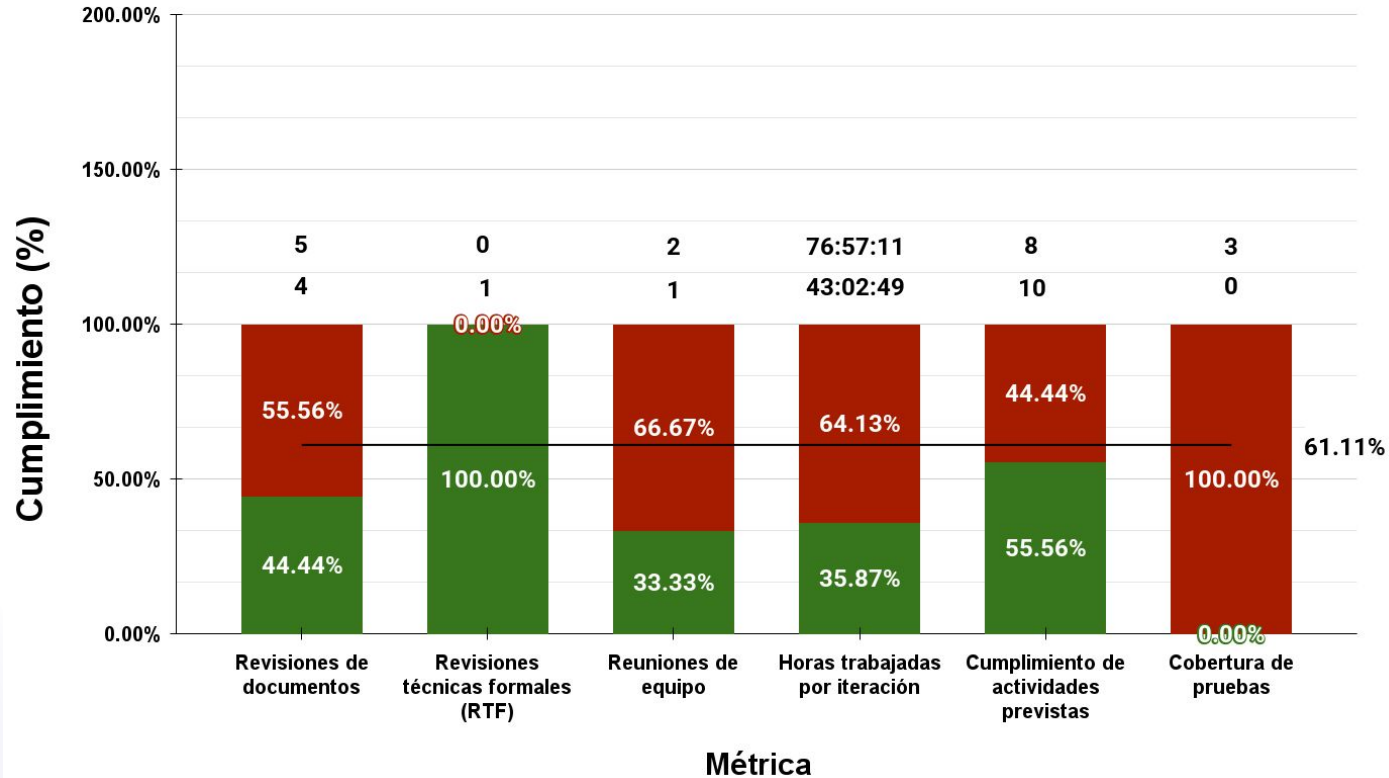

Métricas de Calidad a lo largo del proyecto

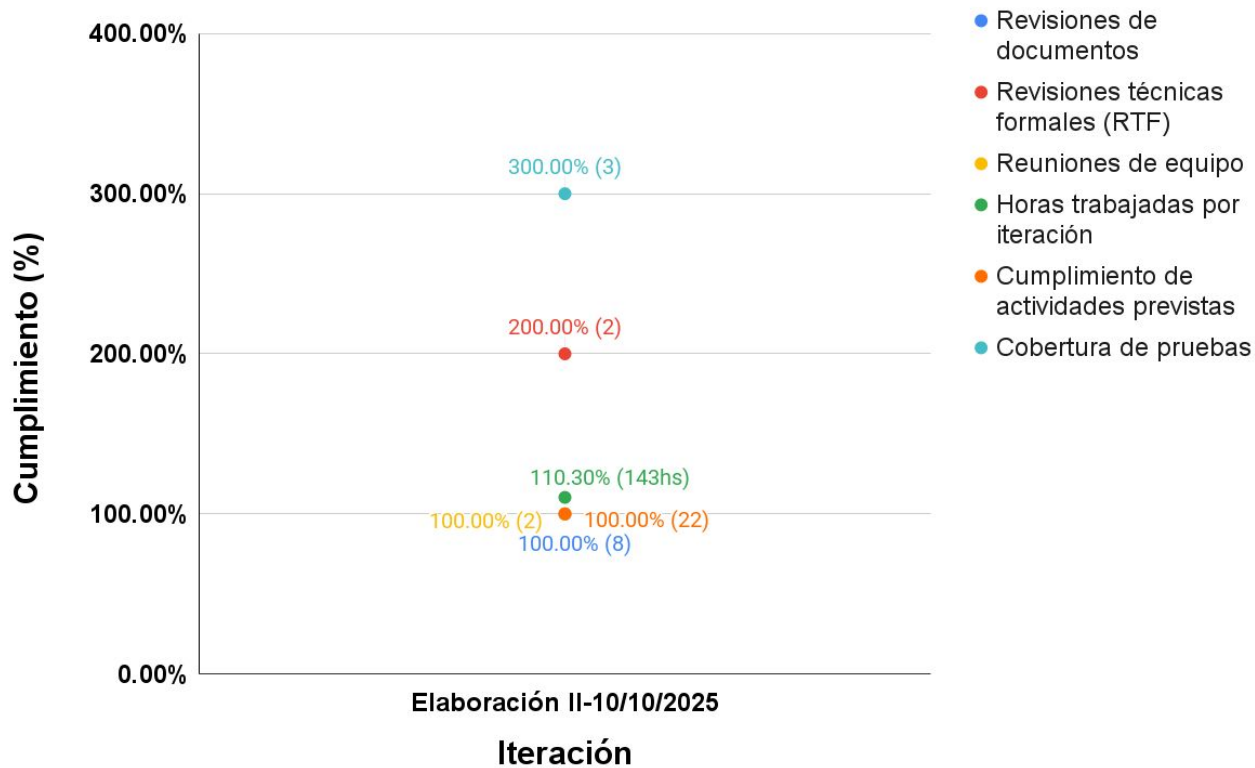

¡Muchas gracias!

